



Commune de SAINT GEORGES-SUR-CHER

**Alimentation de 5 commerces
Place Bretonneau.**

Bureau d'études VRD

1, Rue de la Briaudière - 37510 BALLAN-MIRE

Tél : 02 47 53 95 15

Fax : 08 11 38 50 18

cahierderoute@orange.fr

Maître d'ouvrage

**Commune de
Saint Georges sur Cher**

Maître d'œuvre

Architecte (mandataire)

**Dominique MAES
Bureau d'études VRD
Cahier de Route**

Montant des travaux : 230 000,00 € H.T.

Descriptif des travaux : Alimentation de 5 commerces
Place Bretonneau

LOT N°1 - Assainissement, Eau Potable, Voirie

Viabilisation des commerces place Bretonneau

- Réalisation de trottoirs,
- Pose de bordures T2/CS2 en délimitation de trottoir,
- Réalisation de tranchées techniques sur 265 ml comprenant :
 - La pose de fourreaux :
 - Ø 42/45 pour réseau FT,
 - Ø 63 pour branchements BT, AEP, Gaz,
 - Ø 100 pour réseau BT et éclairage public,
 - Ø 160 pour réseau gaz, Ø 160 et Ø 200 en attente sous porche.

Descriptif des travaux *(suite)*

LOT N°1 - Assainissement, Eau Potable, Voirie *(suite)*

Viabilisation des commerces place Bretonneau *(suite)*

- Réalisation du réseau d'assainissement eaux pluviales sur 243 ml comprenant :
 - Les terrassements de tranchées,
 - La fourniture et pose de collecteurs PVC CR8 :
 - Ø 125, Ø 160, Ø 200 en branchements,
 - Ø 200, Ø 315, Ø 400 en collecteurs,
 - L'ensemble des regards et dispositifs de fermeture.

- Réalisation du réseau d'assainissement eaux usées sur 125 ml comprenant :
 - Les terrassements de tranchées,
 - La fourniture et pose de collecteurs PVC CR8 :
 - Ø 125 en branchements,
 - Ø 160 en collecteurs,
 - L'ensemble des regards et dispositifs de fermeture.

- Fourniture et pose de bacs dégraisseur 200 litres.
- Pose en tranchée du réseau d'alimentation en eau potable sur 157 ml comprenant :
 - La pose d'une canalisation Ø 63 CPV 16 bars,
 - L'ensemble des vannes et pièces spéciales,
 - La réalisation des branchements Ø 32,
 - La pose d'un ensemble de comptage de type PAMCO.

Assainissement eaux usées, Rue de Verdun


- Démolition de la chaussée et terrassement de la tranchée,
- Pose en tranchée d'un collecteur Ø 200 PVC CR8 sur 230 ml,
- Réalisation des branchements en Ø 125 PVC,
- Pose de boîtes de branchement en PVC.

Renforcement en eau potable, Rue de Verdun

- La fourniture et pose de canalisations en CPV 16 bars Ø 110 et Ø 140 mm sur 150 ml,
- Fourniture et mise en place des vannes et pièces spéciales,
- Reprise des branchements,
- Fourniture et pose d'un poteau incendie Ø 110 mm.

LOT N°2 - Éclairage Public

- Pose de console murale de type Vence,
- Fourniture et pose d'éclairage en hublot anti-vandalisme,
- Fourniture et raccordement d'une armoire de commande de type *radiolite II* sur comptage existant.

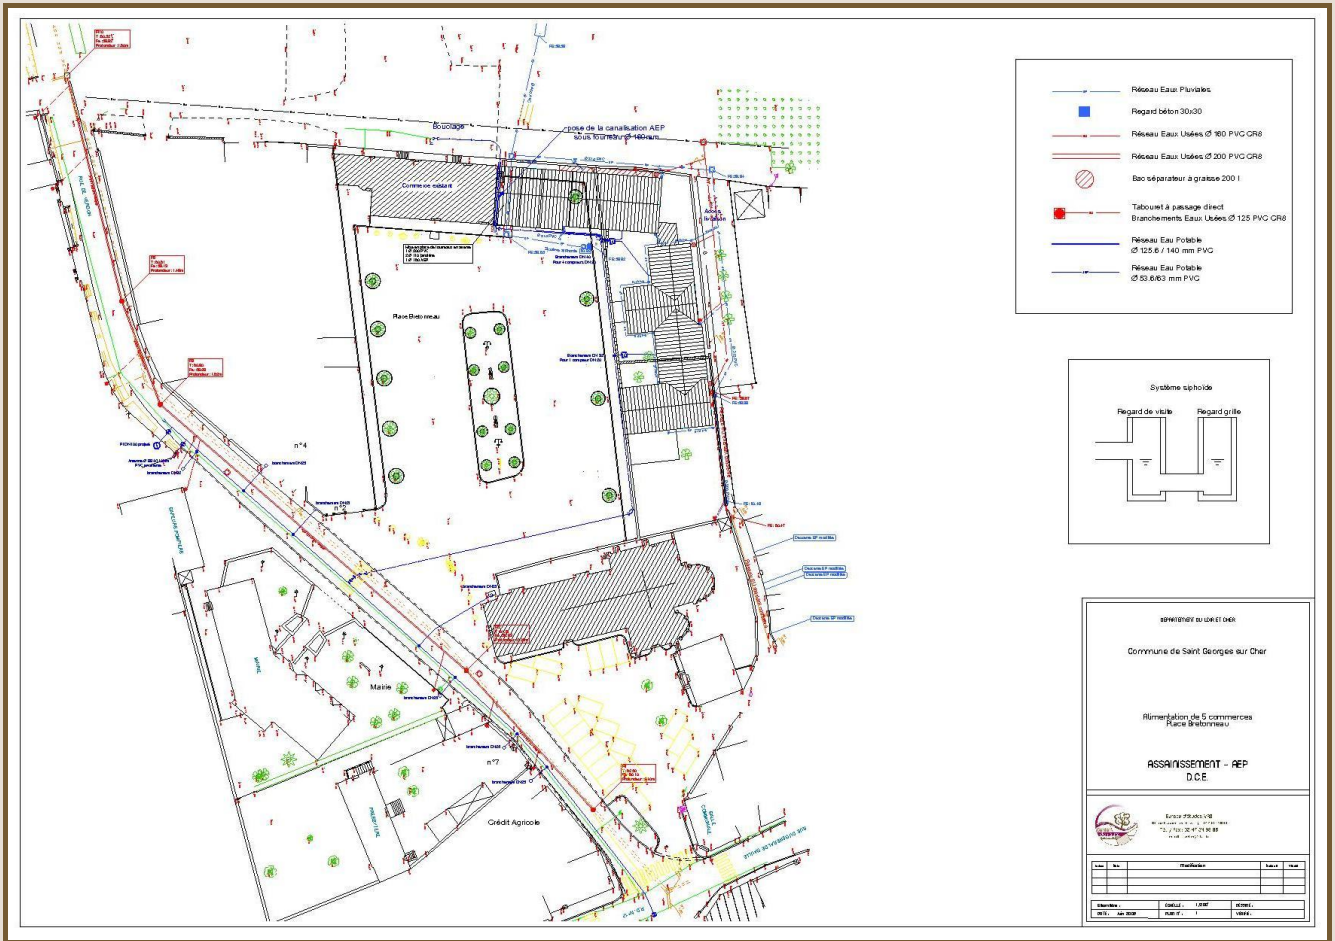

Plan des travaux assainissement / eau potable



Rue de Verdun **en cours** de travaux



Démarrage des travaux : **Octobre 2008**

État du chantier : **Réceptionné**
