



Bureau d'études VRD  
1, Rue de la Briaudière - 37510 BALLAN-MIRÉ  
TÉL. / Fax : 02 47 53 95 15

Ville d'ESVRES-SUR-INDRE

Remplacement de la canalisation  
AEP Rue du Parc

Remplacement de la canalisation  
AEP Rue des Cerisiers

**Maître d'ouvrage**

**Ville d'Esvres-sur-Indre**



**Maître d'œuvre**

Bureau d'études VRD  
**Cahier de Route**

**Montant des travaux :** 64 000,00 € H.T.

**Descriptif des travaux :** Remplacement de la canalisation AEP Rue du Parc  
Remplacement de la canalisation AEP Rue des Cerisiers

- Ouverture de la tranchée et remblais,
- Pose d'une conduite 160 PVC 16 bars en parallèle à l'existante (150 Fonte),
- Raccordement sur la conduite 125 Fonte existante,
- Reprise des branchements existants sur la nouvelle conduite,
- Dépose du poteau d'incendie existant,
- Fourniture et pose d'une bouche d'incendie,
- Raccordement sur conduite 63 PVC (existante et conservée),
- Fourniture et pose des pièces spéciales, vannes et brides.

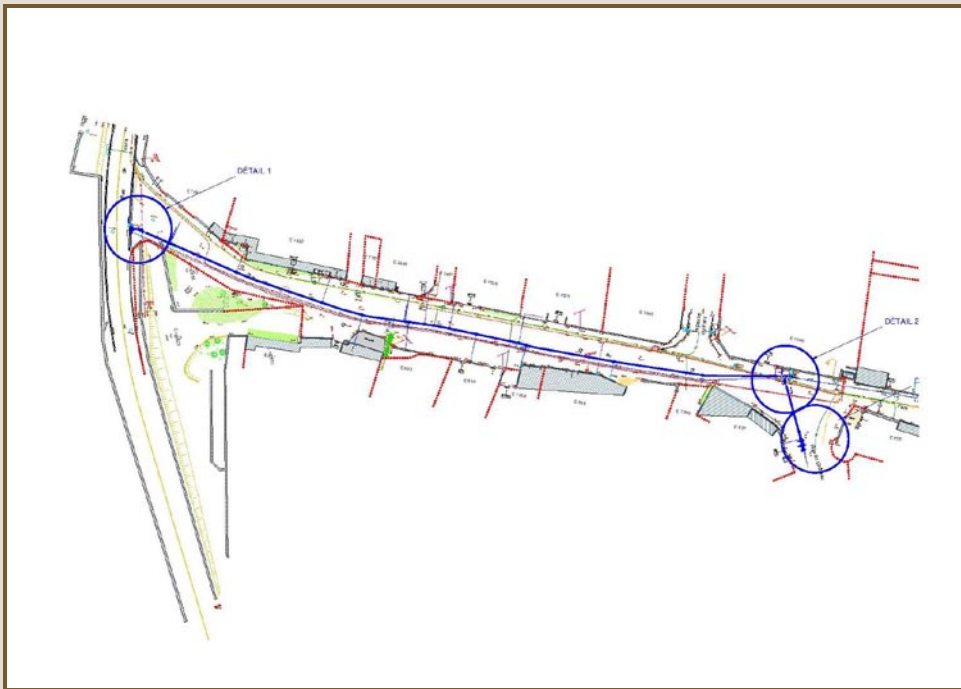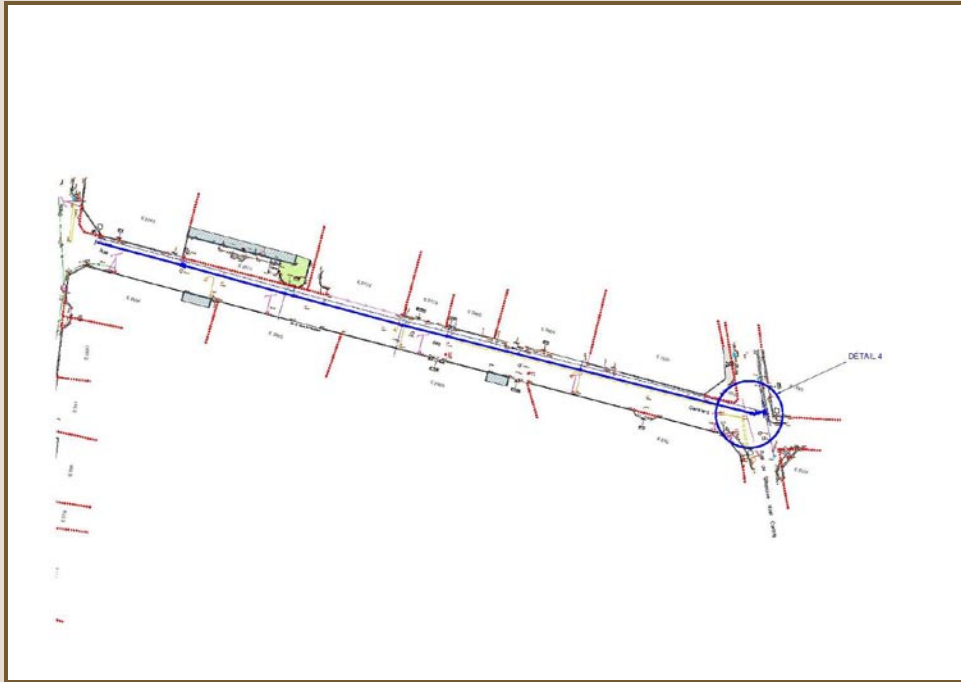

Plans de remplacement de la canalisation AEP Rue du Parc et Rue des Cerisiers

**Démarrage des travaux :** Juin 2008

**État du chantier :** Réceptionné
